

Acta de Constitución del Proyecto

Proyecto:	Sistema Web Torcly para la Gestión Operativa del GRUPO MECATRONIC MC PERU S.A.C.
Código:	G-01
Fecha:	17 de septiembre de 2026

RACIONALIDAD Y PROPÓSITO DEL PROYECTO:

El proyecto surge ante la necesidad del **GRUPO MECATRONIC MC PERU S.A.C.** de mejorar la gestión y el control de sus procesos administrativos y operativos, los cuales actualmente dependen principalmente de registros manuales y medios de información independientes. Esta situación dificulta mantener un control actualizado del inventario, centralizar la información de clientes y vehículos, consultar el historial de servicios y realizar un seguimiento organizado de los vehículos durante su atención en el taller, generando riesgos de errores, duplicidad, pérdida de información y limitada trazabilidad de las operaciones.

En respuesta a esta problemática, el propósito del proyecto es desarrollar e implementar el Sistema Web Torcly, una solución de gestión integral orientada a digitalizar y centralizar la información relacionada con clientes, vehículos, productos, inventario, servicios automotrices, citas, ventas, pagos y operaciones del taller. La solución permitirá sustituir progresivamente los registros manuales por información digital organizada, actualizada y disponible para los usuarios autorizados. Torcly integrará además BI para el seguimiento mediante indicadores y un componente de IA para recomendar reposiciones de inventario con datos suficientes; las decisiones comerciales permanecerán bajo responsabilidad de usuarios autorizados.

Objetivos del Proyecto:

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar e implementar un sistema web de gestión integral para Mecatronic que centralice y digitalice los principales procesos administrativos y operativos de la tienda y del taller, permitiendo gestionar de manera organizada la información y operaciones realizadas por la empresa. El alcance incluye diez componentes funcionales, con BI e IA asistencial orientada al inventario.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Implementar un módulo de gestión de inventario que permita registrar productos, controlar entradas y salidas, consultar existencias y mantener actualizado el stock disponible.
- Desarrollar un módulo de gestión de clientes que permita registrar, actualizar, consultar y buscar información mediante datos como DNI, RUC o número de contacto.

- Desarrollar un módulo de gestión de vehículos que permita registrar y consultar las unidades atendidas, relacionarlas con sus respectivos clientes y mantener un historial de los servicios realizados.
- Implementar un módulo de gestión de ventas que permita registrar las operaciones realizadas, productos vendidos, importes y métodos de pago asociados.
- Desarrollar un módulo de gestión de citas que permita registrar, actualizar y consultar las atenciones programadas, asociándolas con clientes y vehículos, así como controlar su fecha, hora y estado.
- Implementar un módulo de control de pagos que permita registrar y consultar los pagos correspondientes a ventas y servicios, incluyendo importe, método de pago y estado de la operación.
- Implementar funcionalidades para el registro y seguimiento de operaciones que permitan controlar los servicios del taller y conocer el estado de cada atención desde su registro hasta su finalización.
- Implementar BI y analítica operativa con indicadores, paneles, tendencias y reportes basados en los registros de Torcly.
- Implementar IA para analizar movimientos, ventas y consumo de productos en servicios y generar recomendaciones de reposición cuando existan datos suficientes, sin ejecución automática.

IMPACTO ESPERADO

La implementación del proyecto permitirá reducir la dependencia de registros manuales, centralizar la información de la empresa y mejorar la trazabilidad de sus operaciones. Se espera facilitar el acceso a la información, fortalecer el control del inventario, organizar la atención de clientes y vehículos, mejorar el seguimiento de ventas, citas y pagos, y proporcionar información más confiable para la gestión diaria de Mecatronic. Los paneles de BI facilitarán el seguimiento operativo y la IA apoyará la planificación de reposición sin reemplazar la decisión humana.

Estrategia del Proyecto:

MODELO DE INTERVENCIÓN

El proyecto se desarrollará mediante un enfoque incremental basado en Scrum, permitiendo organizar el trabajo en entregas progresivas y realizar validaciones periódicas con los representantes del **GRUPO MECATRONIC MC PERU S.A.C.** La intervención comprenderá el levantamiento y validación de requerimientos, análisis y diseño de la solución, elaboración de prototipos, desarrollo e integración de los módulos, ejecución de pruebas funcionales, validación con los usuarios y entrega final del sistema con su documentación correspondiente. Este enfoque permitirá incorporar oportunamente las observaciones de la empresa y mantener el desarrollo alineado con sus procesos reales.

ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto comprende el análisis, diseño, desarrollo, integración, pruebas, implementación y entrega del **Sistema Web Torcly**, orientado a centralizar y digitalizar los principales procesos administrativos y operativos de la tienda y el taller del GRUPO MECATRONIC MC PERU S.A.C.

El alcance funcional de Torcly comprende los siguientes componentes:

- Gestión de Clientes y Vehículos: registro, actualización, consulta y asociación de clientes con los vehículos atendidos por la empresa, permitiendo conservar información necesaria para su identificación y seguimiento.
- Gestión de Productos e Inventario: administración del catálogo de productos y control de existencias mediante el registro y trazabilidad de los movimientos de inventario.
- Gestión de Servicios Automotrices: administración del catálogo de servicios ofrecidos por el taller, incluyendo la información necesaria para su utilización en citas, atenciones y operaciones del taller.
- Gestión de Citas y Atenciones: programación, actualización, consulta y seguimiento de las atenciones asociadas a clientes, vehículos y servicios.
- Gestión de Operaciones del Taller: registro y seguimiento de los vehículos atendidos desde su recepción hasta la finalización de los trabajos, considerando diagnóstico, servicios realizados, productos o repuestos utilizados, responsables y estado de la atención.
- Gestión de Ventas y Pagos: registro y seguimiento de las operaciones comerciales correspondientes a productos y servicios, así como de los pagos y medios de pago asociados.
- Consulta y Control Operativo: consulta centralizada de registros y estados transaccionales para dar seguimiento a la operación diaria.
- Seguridad y Control de Acceso: autenticación de usuarios, gestión de perfiles autorizados y restricción de funcionalidades de acuerdo con los permisos establecidos.
- Inteligencia de Negocios (BI) y Analítica Operativa: paneles, indicadores, reportes, filtros y tendencias de inventario, ventas, pagos, servicios, citas y operaciones del taller basados en información registrada en Torcly.
- Inteligencia Artificial para Apoyo a la Gestión de Inventario: análisis del histórico de movimientos, ventas y consumo en servicios para generar estimaciones o recomendaciones de reposición con datos suficientes; visualización de insuficiencia de datos cuando corresponda.

El proyecto comprende adicionalmente la integración de los módulos desarrollados, las pruebas funcionales y de integración, el despliegue en el entorno tecnológico autorizado, la elaboración de la documentación técnica y de usuario, la capacitación de los usuarios involucrados y la validación funcional de la solución con los representantes de Mecatronic.

LÍMITES DEL ALCANCE

La primera versión del Sistema Web Torcly no contempla la integración con sistemas contables, plataformas de facturación electrónica, servicios tributarios ni otras plataformas empresariales externas. Asimismo, no comprende el desarrollo de aplicaciones móviles nativas.

La migración de información histórica estará limitada a los registros proporcionados por Mecatronic que se encuentren disponibles, legibles, completos y previamente validados para su incorporación al sistema. BI y la IA asistencial para reposición de inventario forman parte del alcance comprometido para Torcly V1.0. Quedan fuera la ejecución automática de compras, pedidos y movimientos de stock, así como las aplicaciones de IA para otros procesos. Toda ampliación se someterá a control de cambios.

CRONOGRAMA POR FASES E HITOS

El proyecto se desarrollará durante el periodo comprendido entre el 22 de agosto y el 11 de diciembre de 2026 (16 semanas consecutivas; cada semana inicia en sábado y concluye en viernes), de acuerdo con la línea base de planificación establecida en el Cronograma del Proyecto (CRON-01). La ejecución se organizará en cinco fases principales, cuyas actividades podrán presentar solapamientos controlados de acuerdo con sus dependencias, disponibilidad de recursos y necesidades de integración.

FASE 1 – INICIO Y PLANIFICACIÓN (semanas 1 a 4: 22/08 al 18/09)

Periodo: 22/08/2026 – 18/09/2026

Comprende la revisión de la información inicial de la empresa, identificación de actores y partes interesadas, levantamiento y consolidación de información sobre los procesos de la tienda y el taller, definición de la problemática, objetivos, indicadores, supuestos, restricciones y alcance del proyecto, así como la preparación de los instrumentos necesarios para orientar su ejecución.

Hito (18/09/2026): Línea base inicial del proyecto y requerimientos preliminares definidos y validados.

FASE 2 – ANÁLISIS Y DISEÑO (semanas 5 a 7: 19/09 al 09/10)

Periodo: 19/09/2026 – 09/10/2026

Comprende el análisis funcional y técnico de Torcly, el modelado de procesos y requerimientos, definición de actores y funcionalidades, diseño de la arquitectura de la solución, modelo de datos y elaboración y validación de los prototipos e interfaces principales del sistema.

Hito (09/10/2026): Análisis funcional, arquitectura, modelo de datos y diseño de la solución completados.

FASE 3 – CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA WEB TORCLY (semanas 8 a 13: 10/10 al 20/11)

Periodo: 10/10/2026 – 20/11/2026

Comprende el desarrollo e integración de los ocho componentes operativos y de seguridad, así como BI y la IA para apoyo de reposición. Se prepararán los datos históricos y se mostrarán recomendaciones solo para productos con información suficiente.

Durante esta fase se realizarán revisiones periódicas de los incrementos desarrollados para comprobar su correspondencia con los requerimientos establecidos.

Hito (20/11/2026): Diez componentes funcionales desarrollados e integrados en una versión candidata de Torcly.

FASE 4 – PRUEBAS Y VALIDACIÓN (semanas 14 y 15: 21/11 al 04/12)**Periodo: 21/11/2026 – 04/12/2026**

Comprende pruebas funcionales y de integración de los diez componentes, verificación de cálculos y filtros de BI, consistencia de datos, evaluación de IA con históricos suficientes e insuficientes, trazabilidad de recomendaciones y confirmación de que la IA no ejecuta compras ni modifica existencias. Se registrarán incidencias y validarán resultados con usuarios de Mecatronic.

Hito (04/12/2026): Torcly V1.0 con módulos operativos, BI e IA asistencial probados y funcionalmente validados.

FASE 5 – IMPLEMENTACIÓN Y CIERRE (semanas 15 y 16: 28/11 al 11/12)**Periodo: 28/11/2026 – 11/12/2026**

Comprende la preparación del entorno final, despliegue de la solución, verificación posterior a la implementación, elaboración y consolidación de la documentación técnica y de usuario, capacitación de los usuarios involucrados, presentación de resultados y formalización del cierre del proyecto.

Hito (11/12/2026): Sistema Web Torcly V1.0 implementado, documentado, validado y entregado.

PRESUPUESTO RESUMIDO DEL PROYECTO

Para fines de planificación y evaluación del proyecto, se establece un presupuesto referencial de S/ 10,000.00, distribuido entre las principales categorías necesarias para el análisis, diseño, desarrollo, implementación y entrega del Sistema Web Torcly. Los montos son estimados y representan la valorización de los recursos requeridos durante la ejecución del proyecto.

CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	MONTO ESTIMADO
-----------	-------------	----------------

Recursos humanos	Valorización del trabajo realizado por el líder del proyecto, analista de sistemas, desarrolladores Full-Stack y administrador de base de datos.	S/ 5,000.00
Infraestructura tecnológica	Servicios de alojamiento web, despliegue, dominio y recursos necesarios para mantener disponible el sistema.	S/ 1,200.00
Hardware y equipamiento	Equipamiento complementario requerido para pruebas y operación, incluyendo lector de código de barras y accesorios tecnológicos.	S/ 1,000.00
Software y herramientas	Herramientas, servicios y recursos utilizados para diseño, desarrollo, gestión, pruebas y documentación del proyecto.	S/ 800.00
Pruebas e implementación	Recursos destinados a pruebas funcionales, validación con usuarios, configuración, despliegue y puesta en funcionamiento del sistema.	S/ 1,000.00
Contingencia	Reserva destinada a cubrir necesidades imprevistas, ajustes técnicos o gastos adicionales durante el desarrollo.	S/ 1,000.00
TOTAL, ESTIMADO DEL PROYECTO		S/ 10,000.00

RIESGOS DE ALTO NIVEL

RIESGO	DESCRIPCIÓN
Disponibilidad limitada de los representantes de la empresa	La disponibilidad del propietario, administradora y personal técnico puede afectar las reuniones de levantamiento, revisión y validación de los entregables del proyecto.
Retraso o insuficiencia de información	La entrega tardía o incompleta de información sobre los procesos actuales puede retrasar la definición y validación de los requerimientos del Sistema Web Torcly.
Inconsistencia de los registros actuales	Los registros manuales existentes pueden presentar información incompleta, duplicada o diferente de la situación real, afectando la preparación y carga inicial de datos.
Cambios en los requerimientos y alcance	La incorporación de nuevos requerimientos durante el desarrollo puede incrementar el trabajo previsto y comprometer el cumplimiento del cronograma académico.

Fallas funcionales del sistema	Errores en los módulos principales podrían afectar el registro del inventario, la gestión de clientes y vehículos, las ventas y el seguimiento de las operaciones del taller.
Riesgos de seguridad y pérdida de información	El acceso no autorizado, pérdida o alteración de información podría comprometer los datos personales, comerciales y operativos almacenados en el sistema.
Problemas de conectividad o disponibilidad tecnológica	Las interrupciones de Internet o de los servicios tecnológicos utilizados podrían limitar temporalmente el acceso y funcionamiento del sistema web.
Problemas de compatibilidad o rendimiento	El sistema podría presentar dificultades de visualización o rendimiento en la laptop, tablet o dispositivos utilizados por la empresa.

SUPUESTOS DE ALTO NIVEL

Supuesto	Descripción
Disponibilidad de información operativa	Se asume que la empresa proporcionará la información necesaria sobre inventario, clientes, vehículos, servicios, ventas, pagos, citas y demás procesos incluidos en el proyecto.
Participación del personal clave	Se considera que el propietario, la administradora y el personal técnico participarán en el levantamiento de información, revisión de prototipos y validación de funcionalidades.
Validación del Sponsor	Se asume que Jhon Medina, como Sponsor empresarial, participará en la priorización de requerimientos y aprobación de los principales entregables del proyecto.
Continuidad de las operaciones de la empresa	Se considera que las actividades habituales de la tienda y el taller continuarán desarrollándose durante el proyecto, permitiendo validar Torcly sobre los procesos reales.
Adopción progresiva del sistema	Se asume que los usuarios involucrados tendrán disposición para utilizar progresivamente Torcly y sustituir los registros manuales correspondientes a los procesos digitalizados.
Registro adecuado de información	Se considera que los usuarios autorizados registrarán información completa, correcta y actualizada en el sistema.
Disponibilidad de infraestructura mínima	Se asume que la empresa mantendrá disponibles la laptop, tablet y conectividad a Internet necesarias para utilizar el sistema web.
Disponibilidad de los servicios tecnológicos	Se considera que los servicios de alojamiento, backend y base de datos estarán disponibles durante las pruebas, validación e implementación de Torcly.

RESTRICCIONES DE ALTO NIVEL

RESTRICCIÓN	DESCRIPCIÓN
Tiempo del proyecto	El proyecto deberá ejecutarse dentro del periodo académico establecido, por lo que el análisis, diseño, desarrollo, pruebas, implementación y documentación estarán sujetos al cronograma definido.
Alcance funcional	La primera versión de Torcly estará limitada a los procesos y funcionalidades prioritarias definidas para la gestión operativa de la empresa.
Migración limitada de información histórica	No se realizará la digitalización completa de todos los registros históricos; únicamente se incorporará información disponible, legible, relevante y previamente validada.
Dependencia de Internet	Al tratarse de un sistema web, su utilización dependerá de la disponibilidad y estabilidad de la conexión a Internet.
Infraestructura tecnológica existente	El proyecto priorizará el aprovechamiento de los equipos actualmente disponibles en la empresa y no contempla una renovación integral de infraestructura tecnológica.
Integraciones externas fuera del alcance	La versión inicial no contempla integración directa con sistemas contables, plataformas de facturación electrónica u otros servicios empresariales externos.
Acceso limitado a información sensible	Los datos personales, comerciales y financieros sensibles serán protegidos y, para fines académicos, se utilizarán datos ficticios, aproximados o anonimizados cuando corresponda.
Presupuesto limitado	La ejecución deberá mantenerse dentro de los recursos asignados al proyecto, tomando como referencia el presupuesto estimado de S/ 10,000.00 , por lo que cualquier requerimiento adicional deberá ser evaluado antes de su incorporación.

Estructura de gobernabilidad:

ESTRUCTURA DE GOBERNABILIDAD DEL PROYECTO

La gobernabilidad del proyecto establece los niveles de autoridad, responsabilidades, mecanismos de supervisión y procedimientos de toma de decisiones que serán aplicados durante el desarrollo del sistema web para Mecatronic

La estructura estará conformada por un representante de la empresa, un líder del proyecto, el equipo de desarrollo y el docente encargado de la revisión académica. Esta organización permitirá mantener una comunicación clara entre la empresa y el equipo, realizar el seguimiento de los entregables y gestionar oportunamente cualquier cambio o situación que pueda afectar el proyecto.

ROLES Y RESPONSABILIDADES

Rol / Responsable	Responsabilidades principales
Representante de Mecatronic – Ysabel Quiteros Montoya	Representar a la empresa durante el proyecto, proporcionar información sobre los procesos administrativos, validar los requerimientos, revisar los avances funcionales y participar en la aprobación de cambios que puedan afectar el alcance del sistema.
Líder del Proyecto – José Manuel Sebastian Mercado Rojas	Planificar y coordinar las actividades del equipo, realizar seguimiento al cronograma y entregables, distribuir responsabilidades, gestionar riesgos e incidencias, mantener la comunicación con Mecatronic y coordinar la toma de decisiones del proyecto.
Analista de Sistemas – Arian Armando Bautista Quezada	Levantar, analizar y documentar los requerimientos del sistema, modelar los procesos identificados y verificar que las funcionalidades desarrolladas respondan a las necesidades de Mecatronic.
Programador Full-Stack – Brenda Gabriela Ormeño Bocanegra	Desarrollar e integrar funcionalidades del sistema tanto a nivel de interfaz como de lógica de negocio, además de participar en las pruebas y corrección de incidencias.
Administrador de Base de Datos – Piero Ramírez Alva	Diseñar, implementar y mantener la estructura de la base de datos, gestionar las relaciones entre las entidades y garantizar la correcta persistencia e integridad de la información utilizada por el sistema.

Programador Full-Stack – Carmen Katerin Vega Meza

Desarrollar e integrar funcionalidades del sistema web, colaborar en la implementación de los módulos definidos y participar en las pruebas, integración y corrección de errores.

NIVELES DE AUTORIDAD

La toma de decisiones se organizará de acuerdo con el impacto de cada situación sobre el proyecto.

TIPO DE DECISIÓN	RESPONSABLE DE ANALIZAR	RESPONSABLE DE APROBAR
Decisiones técnicas dentro del alcance aprobado	Equipo de desarrollo	Líder del Proyecto
Interpretación o aclaración de requerimientos	Analista de Sistemas y Líder del Proyecto	Representante de Mecatronic
Cambios en requerimientos funcionales	Líder del Proyecto + Equipo	Líder del Proyecto + Representante de Mecatronic
Cambios que afecten el alcance del proyecto	Líder del Proyecto + Representante de Mecatronic	Aprobación conjunta del Líder del Proyecto y representante de Mecatronic
Modificaciones internas en la distribución de tareas	Líder del Proyecto	Líder del Proyecto
Validación de funcionalidades desarrolladas	Equipo de desarrollo	Representante de Mecatronic
Revisión de documentación académica	Equipo del Proyecto	Docente / Supervisor Académico
Aceptación de entregables del proyecto	Líder del Proyecto y Equipo	Representante de Mecatronic

PROCESO DE TOMA DE DECISIONES

Las decisiones del proyecto se tomarán considerando su nivel de impacto. Las decisiones técnicas que no modifiquen el alcance podrán ser resueltas internamente por el equipo y aprobadas por el Líder del Proyecto.

Cuando una decisión involucre requerimientos del negocio o funcionalidades solicitadas por Mecatronic, deberá ser consultada con Ysabel Quiteros Montoya, como representante de la empresa.

En caso de que se solicite un cambio que pueda modificar el alcance, los entregables o el cronograma del proyecto, la situación será evaluada conjuntamente por el Líder del Proyecto y la representante de Mecatronic. La modificación solo será incorporada cuando ambas partes estén de acuerdo con su impacto y prioridad.

El proceso general será:

Identificación de la necesidad o problema → Análisis por el equipo → Evaluación del impacto → Presentación al responsable correspondiente → Toma de decisión → Registro del acuerdo → Ejecución y seguimiento.

MECANISMO DE SUPERVISIÓN

La supervisión del proyecto se realizará de manera continua durante las dieciséis semanas de ejecución.

El Líder del Proyecto será responsable de verificar el cumplimiento de las actividades, avances, entregables y responsabilidades asignadas al equipo.

Asimismo, se realizarán entre una y dos reuniones semanales con Mecatronic, según la disponibilidad y necesidad del proyecto. Estas reuniones permitirán:

- Presentar avances del sistema.
- Validar funcionalidades desarrolladas.
- Aclarar requerimientos.
- Recoger observaciones de la empresa.
- Evaluar posibles cambios.
- Comunicar dificultades o riesgos identificados.
- Confirmar las actividades siguientes.


Por otra parte, el docente realizará una revisión semanal de la documentación, proporcionando retroalimentación sobre los documentos elaborados durante el proyecto.

RENDICIÓN DE CUENTAS


Cada integrante del equipo será responsable de las actividades asignadas de acuerdo con su rol. El avance de dichas actividades deberá ser comunicado al Líder del Proyecto, quien consolidará el estado general del proyecto y verificará el cumplimiento del cronograma.

Los avances funcionales y decisiones relevantes serán comunicados a la representante de Mecatronic durante las reuniones de seguimiento.

Las principales decisiones, modificaciones de requerimientos y acuerdos alcanzados deberán quedar documentados para mantener la trazabilidad durante el desarrollo del proyecto.

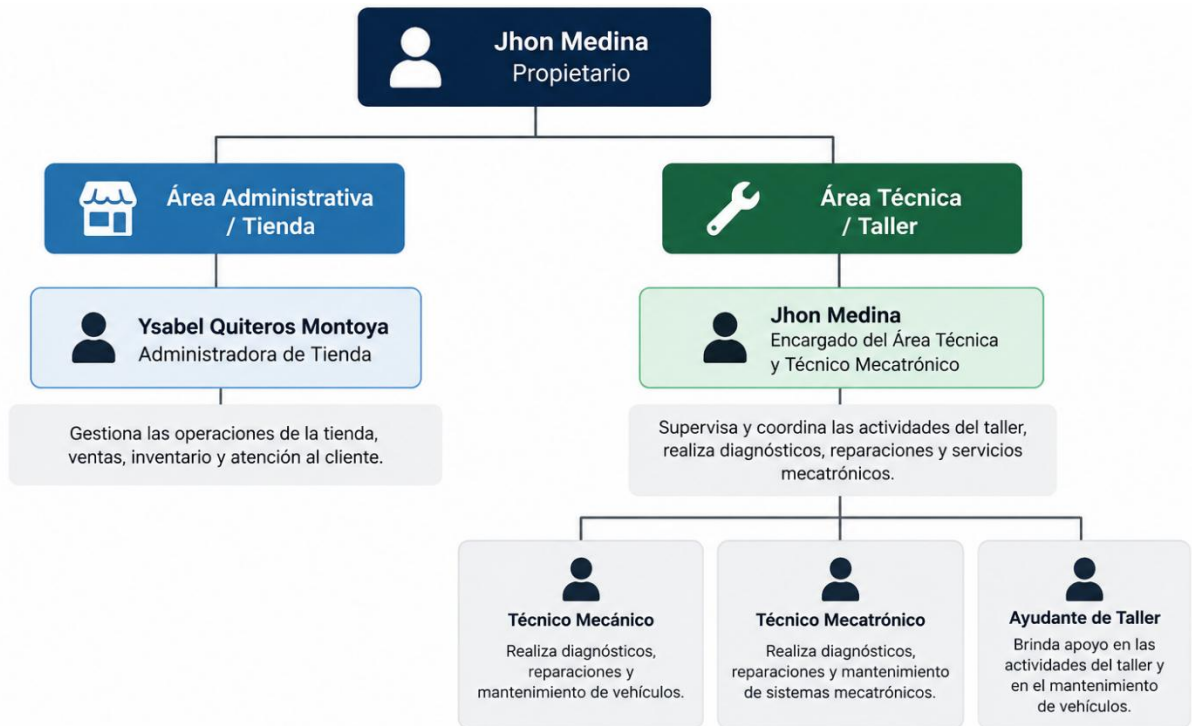

Gerencia del Proyecto:

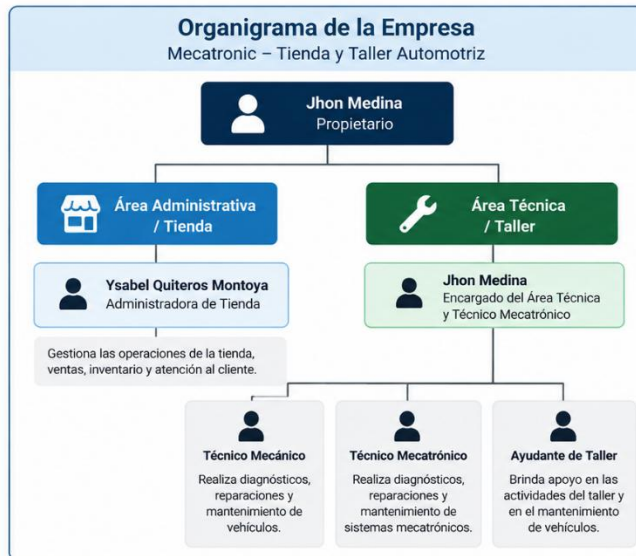

Control de Cambios:

CONTROL DE CAMBIOS

El proyecto contará con un mecanismo formal para identificar, evaluar, aprobar y dar seguimiento a los cambios significativos que puedan surgir durante su desarrollo. Este control permitirá evitar modificaciones no autorizadas que afecten el alcance, cronograma, requerimientos o entregables establecidos.

Cuando un integrante del equipo o el representante de Mecatronic identifique la necesidad de realizar un cambio, este deberá ser comunicado al Líder del Proyecto, quien registrará la solicitud y analizará su impacto en el sistema.

La evaluación del cambio deberá considerar principalmente su efecto sobre el alcance, tiempo de desarrollo, requerimientos, recursos, funcionalidades y entregables del proyecto.

Los cambios menores que no afecten el alcance ni los objetivos podrán ser gestionados internamente por el Líder del Proyecto. Sin embargo, cuando el cambio implique la incorporación, eliminación o modificación significativa de una funcionalidad, deberá ser revisado y aprobado conjuntamente por el Líder del Proyecto y la representante de Mecatronic.

Una vez aprobado, el cambio será incorporado a la documentación correspondiente, al backlog o planificación del proyecto y, cuando sea necesario, al cronograma. Asimismo, se comunicará al resto del equipo para su implementación y seguimiento.

PROCESO DE CONTROL DE CAMBIOS

Identificación del cambio → Registro de la solicitud → Análisis de impacto → Evaluación → Aprobación o rechazo → Actualización de la documentación → Implementación → Verificación

ETAPA	RESPONSABLE	ACCIÓN
Identificación	Equipo del proyecto / Mecatronic	Detectar y comunicar la necesidad de modificar un requerimiento, funcionalidad o entregable.
Registro	Líder del Proyecto	Documentar la solicitud de cambio y su motivo.
Análisis de impacto	Líder del Proyecto y equipo técnico	Evaluar el impacto sobre alcance, tiempo, requerimientos, recursos y funcionalidades.
Aprobación	Líder del Proyecto + Representante de Mecatronic	Aprobar o rechazar los cambios significativos.
Actualización	Líder del Proyecto / Analista de Sistemas	Actualizar requerimientos, documentación, backlog y cronograma cuando corresponda.
Implementación	Equipo del Proyecto	Ejecutar el cambio aprobado.
Verificación y cierre	Líder del Proyecto + Representante de Mecatronic	Verificar que el cambio haya sido implementado según lo acordado y registrar su cierre.

CRITERIOS PARA CONSIDERAR UN CAMBIO SIGNIFICATIVO

Se considerará un cambio significativo cuando:

- Modifique el alcance acordado del proyecto.
- Incorpore o elimine funcionalidades del sistema.
- Modifique requerimientos previamente aprobados.
- Afecte una fecha importante o un entregable.
- Requiera una redistribución considerable del trabajo del equipo.
- Impacte la estructura de la base de datos o la integración entre módulos.

Aprobado por:

- Jhon Medina – Propietario de Mecatronic / Patrocinador del Proyecto
- José Manuel Sebastián Mercado Rojas – Líder del Proyecto
